校园活动
从策划到收尾

结构化策划与管控工作台

连接任务、人员、资源、风险与材料
让每个环节都有行动、有成果、有依据

小组成员

张敬宇（2024303784）　　刘秋彤（2024303785）
王梓安（2024303777）　　胡辰凯（2024303779）

2026 年 10 月

同一个项目，贯通组织全过程



4
阶段全周期

21
内置产出类型



02

校园活动组织的背景与问题

以校园活动为应用场景，关注多阶段、多角色之间的连续协调



活动交流场景示意 · Unsplash

一场活动
牵动多项工作

迎新、科技文化节、竞赛等活动，需要统筹人员、场地、物资、宣传与安全。

01 信息需要同步

计划、通知与材料分散更新，活动日期或场地变化后，需要核对各处是否一致。

02 责任需要接续

策划、筹备与现场执行由不同人员参与，需要明确谁来做、何时做、交付什么。

03 风险需要贯穿全过程

人员缺岗、资源不足或天气变化，都需要提前评估。
预防、响应与升级措施应明确责任。

典型组织场景

场地临时调整

任务排期 → 宣传与报名 → 人员与设备 → 安全与预案

关联事项一起核对

汇报目录

从活动需求到操作流程，再说明结构化方法、运行验证与分工

按活动的使用路径展开

问题
功能
成果



活动场地与设备示意 · Unsplash

5 分钟主讲　3 分钟提问

01 **背景与整体设计**
组织问题 · 工作台定位 · 全周期路径
02–05 主讲

02 **工作台核心功能**
项目协作 · 任务资源 · AI 材料 · 现场执行
06–11 主讲

03 **风险应急与成果交付**
风险分级 · 应急演练 · 版本验收 · 收尾归档
12–13 主讲

04 **结构化方法与运行验证**
方法应用 · 协作测试 · 小组分工 · 成果总结
14–16 主讲

04

把活动组织的各项工作连接起来

面向校园活动的组织工具，支持策划、筹备、执行和收尾全过程

工作台总体定位

同一项目
连续管理

组织者统筹活动，成员执行任务，参与者报名与填写；各角色的工作在项目中衔接。

共同操作空间

以项目为中心，把计划、执行、材料、风险与验收组织到同一操作空间。

工作台能完成哪些工作

围绕同一活动项目

项目与协作

创建、复制活动，统一事实
邀请成员，管理查看与编辑权限

任务与计划

分解四阶段任务，设置期限与依赖
落实实名责任，跟踪执行与验收

人员与资源

管理名册、班次、库存与凭证
检查人员冲突和资源缺口

AI 与过程材料

制作策划书、预算、通知与海报
人工修订，确认版本并导出

资料与工作流

选择资料、模板与技能包
关联卡片，让上下游结果复用

报名与考勤

配置表单、生成手机填写入口
汇总报名、签到签退与班次报告

风险与应急

识别评分、分级预案与场景演练
明确预防、响应及升级责任

交付与收尾

提交材料版本，由组织者验收
决算、复盘、归档与项目复用

功能展示 | 全周期能力

05

一条完整的活动组织路径

三个建设目标：全周期管控、详尽过程材料、风险识别与分级应急

活动场景示意 · Unsplash

01



前期策划

关键操作

维护项目事实 / 方案比选

代表材料

策划书 · 预算表 · 分工表

02



活动筹备


关键操作

宣传报名 / 人员排班

代表材料

海报 · 物料清单 · 应急预案

03



现场执行

关键操作

签到签退 / 记录与响应

代表材料

执行手册 · 考勤 · 现场记录

04



活动收尾

关键操作

决算复盘 / 文件归档

代表材料

决算表 · 复盘报告 · 归档清单

全过程共用 统一事实 多人协作 资料与 AI 风险评估与分级应急

MECE • 逻辑树 按过程时间划分阶段，再把每阶段展开为可执行、可验收的任务。

06

先创建项目，再统一活动事实

项目入口管理活动，项目信息表为后续任务与材料提供共同依据



实际项目库：打开、复制、归档与项目包操作

登录后的个人项目库

一场活动
一份项目空间

创建或导入项目，维护活动名称、日期、场地、人数与预算。

登录 → 项目库 → 项目页面

复用于不同活动

复制已有项目，调整任务、材料和风险配置，继续用于迎新、运动会或竞赛。

统一填写活动事实



项目信息表：用户填写、AI 建议与待确认分开标注

方案比选

设定候选方案、评价维度和权重
保留评分理由，辅助组织者判断

SPIN • 5W2H 从组织难点推导需求，用结构化字段明确活动要做什么、何时何地做、需要哪些资源。

07

把“活动计划”变成可追踪的任务

5W2H 落到任务字段，责任、资源、完成证据与状态相互关联

阶段	任务	服务人员与班次	负责角色	相对时间	工期(天)	产出物	前置任务
前期策划	组建筹备组并明确分工	实名责任人待补充 尚未安排服务班次 安排人员 查看任务 / 提交与验收	总协调	D-30	3	组织分工与职责表	前置任务
前期策划	撰写并提交活动申报表	实名责任人待补充 尚未安排服务班次 安排人员 查看任务 / 提交与验收	策划组	D-27	2	活动申报表	组建筹备组并明确分工

实际任务表：阶段、责任、期限、工时、产出与前置依赖

分解行动

阶段与任务

表格、甘特与检查点

落实责任

实名责任人

岗位要求独立保留

定义完成

实际交付版本

材料和任务明确关联

邀请协作

知道谁来做
也知道做到哪

01 职责分层

组织者管理与验收；成员执行与提交；访客只读。

02 保存可核对

共享版本快照；保存冲突时保留本机草稿。



08

排好人员班次，同时发现资源缺口

任务安排连接实名人员与资源，避免把岗位名称当作实际责任人

从一项任务安排多人



任务安排界面：选择任务与已确认实名人员



同一任务的两个独立班次：人员分别接受、打卡与报告

人员名册 入组与技能

班次安排 时间与地点

独立记录 考勤与报告

资源保障

数量看得见
冲突先发现

物料、设备、场地、车辆和经费统一管理；库存、需求、借出与采购凭证对应到资源。

2 无线麦克风缺口

1 物料运输车缺口



示例资源台账的两项缺口提示

人员冲突、技能不符或资源不足
整组安排不保存，保留当前选择

功能展示 | AI 材料生产

09

从策划书到宣传海报，形成可用材料

AI 草稿经过事实核对与人工修改，才进入正式交付

DeepSeek · 文字与结构　GPT-image2 · 宣传图像



实际策划书：在线编辑、确认交付版本及 Word / Excel / Markdown 导出

选定依据 → 生成草稿 → 人工修订 → **确认与导出**


内置 21 类产出，覆盖预算、分工、执行、复盘与决算，并支持自定义。



已生成成果 · 校园科技文化节海报

让资料和上游结果进入下一项工作

一次整理项目事实与参考资料，后续材料沿相同依据展开

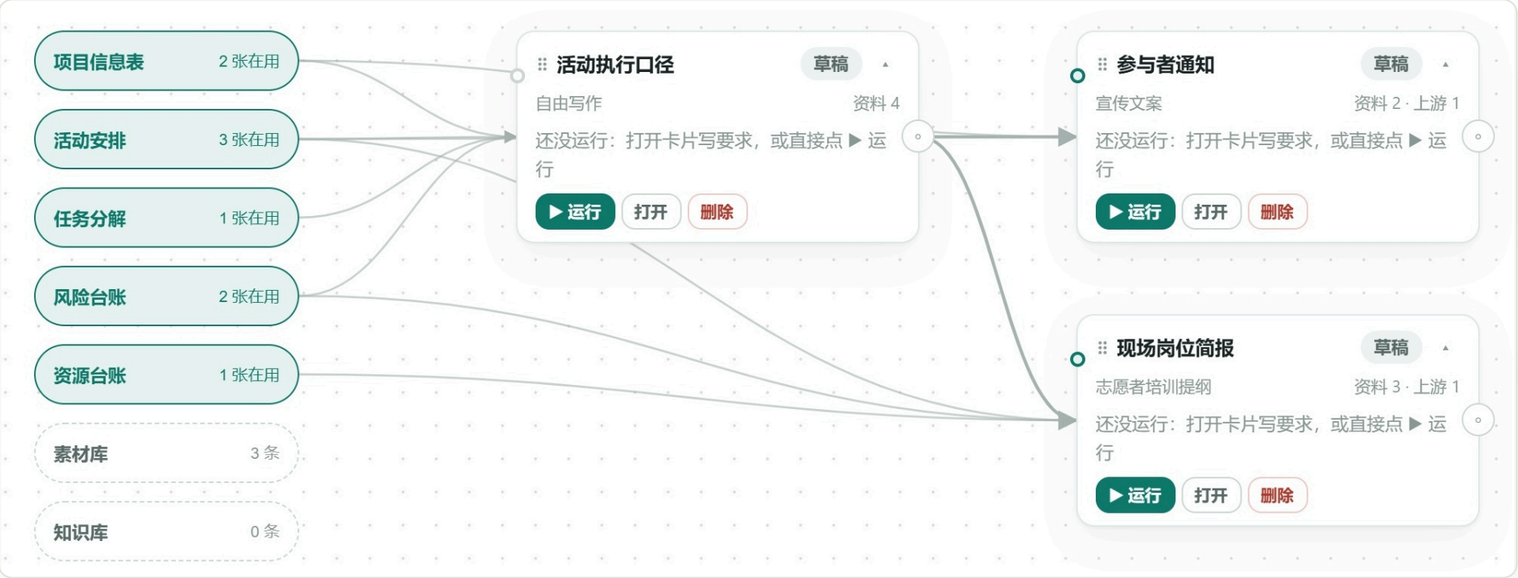

实际引用画布：项目数据、选定资料与卡片依赖；画面为配置中的草稿

资料可选

正文、摘要、来源与核验状态

规则可配

技能包规定章节与输出要求

结果可复用

确认后作为下游引用依据

结构化输入

先规定依据 再生成内容

- **A** 目标：服务哪项活动工作
- **L** 深度：写到什么程度
- **I** 依据：引用什么事实与资料
- **G** 规则：未知项保留待确认
- **N** 成果：章节、表格与格式

单项任务用 RTGO 明确
角色、任务、目标与输出

活动现场：手机填写，按班次执行

参与者信息收集与工作人员执行记录分开组织，汇总可进入活动复盘

参与者报名与签到



实际表单配置：自定义字段、必填项、类型与去重

定义字段 → 链接 / 二维码 → 手机填写 → 汇总与导出

支持现场补登、改错和去重核对；参与者与工作人员分别发码、分别统计。



工作人员个人任务页

工作人员

按自己的班次完成现场工作

1 查看与接受任务

查看岗位、地点、时段与执行要求。

2 签到与签退

留下时间、打卡流水与工时记录。

3 填写执行报告

班次结束保留过程、异常与处理记录。

风险有评分，也有对应的应急动作

全流程识别风险，分级安排责任、预防、响应与升级路径

项目中的天气风险

恶劣天气中断户外环节

4 × **4** = **16**

可能性 | 影响 | 高风险

低 1–7 | 中 8–14 | 高 15–25

提前准备

提前 48 小时跟踪天气
预留体育馆副馆与搬运人力

触发与决策

降雨、大风或气温骤降
总协调 D-1 18:00 前决定转场

响应与升级

发布调整通知、转移展品、引导人流
转场中出现安全风险时升级处置

风险卡片明确：信号 / 预防 / 响应 / 升级



实际天气风险卡片：评分 16，信号、预防、响应与升级

突发变更演练：选择场景，逐步记录处置



实际演练场景：触发、影响、步骤与升级对象

PDCA 预案 → 演练 → 复核 → 写回风险台账

交付可验收，收尾可归档与复用

从“谁执行了什么”到“依据哪个版本验收”，每个环节保留证据

01 **班次报告**
记录过程与异常

02 **确认材料版本**
保存独立快照

03 **提交任务**
选择实际版本

04 **组织者验收**
通过或退回



实际任务详情：执行记录与整项任务验收分别核对

历史验收保留原引用版本

后续编辑与重新生成只改变草稿，新版本另行确认，已验收依据持续可追溯。

活动收尾

把工作结果留下来、用起来

01 **费用与物资**
决算、凭证、借还与回收核对

02 **复盘与归档**
复盘报告、新闻稿与归档清单

03 **迁移与复用**
导出文件、项目包与全量档案

结构化方法怎样进入实际操作

方法对应字段、操作和检查规则，贯穿工作台的使用过程

SPIN

明确组织需求

信息同步、任务衔接、成果验收

MECE / 逻辑树

划分并展开任务

四阶段任务边界与前置依赖

5W2H

补齐执行要素

责任、期限、地点、方法与资源

ALIGN / RTGO

控制 AI 输入与输出

事实与引用、模板、规则、成果

PDCA

检查反馈进入下一轮

交付验收、演练结论、风险修订

加权决策矩阵：评价维度、理由与结果一并保留

评分矩阵 1–5 分，可写打分理由；未评分的格子不计入

方案 \ 维度	目标契合度 权重 5	可行性 权重 4	成本可控 权重 4	风险可控 权重 5	参与体验 权重 4	可复用性 权重 2	加权得分
方案 A：主会场集中式	5 单日集中，人数...	4 只需一个场地，...	4 布置一次到位，...	3 人流集中，拥堵...	4 氛围集中，但排...	4 流程与物料均可...	4.00
方案 B：分会场分布式	4 覆盖面广，但单...	3 需要三套人力与...	2 设备与物料重复...	3 单点风险降低，...	5 就近参与，等待...	3 依赖多点场地，...	3.38
方案 C：线上线下混合	4 线上可放大触达...	4 线下规模小，场...	3 需额外投入直播...	4 现场人数少，安...	3 线上互动弱，体...	5 云端展厅可持续...	3.75

实际方案比选：按同一组维度比较活动路线

策划书输入规则

以项目事实、任务与风险为依据，覆盖责任和检查点，未知内容保留“待确认”，按模板章节与表格输出。

运行协作、测试与小组贡献

可达地址连接不同设备，权限、测试与小组分工支撑完整交付

运行与跨设备协作

浏览器 / 手机入口

↓

Node 服务

↓

账号 · 共享 · 班次 · 考勤
任务交付 · 模型请求

同网通过局域网地址访问；跨网络可使用公网服务或隧道地址。持有效邀请访问项目，手机使用可达地址填写。

保存与备份

导出浏览器项目包
服务端账号、班次与考勤另行备份

实际软件检查结果

验证范围	结果
离线回归	**38 模块 / 1044 断言**
共享与考勤	**82 项通过**
人员与排班	**88 项通过**
任务交付关联	**76 项通过**
浏览器综合	**133 项通过**

各组范围有交叉，分别呈现。AI 编排使用受控响应检查，实际策划书与海报另行核验。

小组分工

张敬宇 (2024303784)

工作台整体设计与功能制作，报告撰写与 PPT 内容整理。

刘秋彤 (2024303785)

工作台界面与交互制作、功能完善，报告撰写、PPT 编排及展示材料整合。

王梓安 (2024303777)

功能测试、操作核查与问题记录。

胡辰凯 (2024303779)

活动流程与风险预案梳理、材料核对。

我们交付的是一套完整的组织工具

工作台的三项核心价值

全周期有行动
过程有材料
风险有预案

结构化思维落实到任务边界、数据关系和验收规则；
AI 依据统一信息辅助生产成果。

人确定目标、核对事实、作出决策与验收

软件验证

38	1044	0
离线回归模块	验证断言	失败项

- ✓ **只读写入被拒绝**
  权限约束落实到操作与接口
- ✓ **冲突和缺口拦截排班**
  不保存部分人员安排，保留表单
- ✓ **验收版本保持稳定**
  后续编辑保留历史交付依据

感谢聆听　欢迎提问

功能与中间产物索引

需要查看某个功能或某类文件时，可据此定位

项目内的主要操作空间

项目与策划

项目库、总览、事实补全、活动安排、方案比选

任务与保障

全周期任务、实名责任、人员名册、班次、资源台账

AI 与资料

产出配置、技能包、参考模板、素材库、卡片工作流

现场与风险

参与者信息收集、考勤、个人任务、风险卡与演练

成果与协作

材料编辑、交付版本、验收、邀请权限、档案导出

内置 21 类产出

这是支持的产出类型，可按项目启用并增加自定义产出。

策划	活动申报表、活动策划书、预算表、场地与资源方案、组织分工与职责表
筹备	海报 / 宣传图、宣传文案、报名表、邀请函 / 通知稿、物料清单、排班表、志愿者培训提纲、风险应急预案
执行	现场执行手册、签到表、现场记录表
收尾	复盘报告、新闻稿 / 感谢信、经费决算表、资料归档清单

Word **Excel** **Markdown / CSV** **JSON 项目包**
